




H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VERACRUZ  
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE  
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

CONTRATO No. MVER-2024-RM-0501

OBRA O SERVICIO No. 2024301930501

ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS

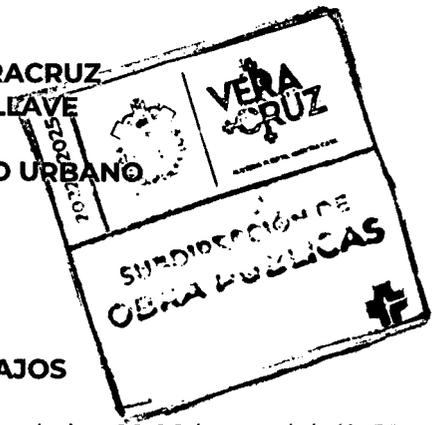

En la Ciudad de Veracruz, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, siendo las 09:00 horas del día **19 DE MARZO DE 2024** y con fundamento en el artículo 64 párrafo primero de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 164, 165, 166 y 167 de su Reglamento, se emite la presente **ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS** correspondientes al contrato No. **MVER-2024-RM-0501** referentes a "**Trabajos extraordinarios de la rehabilitación del parque Superación Ciudadana, col. Cándido Aguilar, Veracruz, Veracruz de Ignacio de la Llave**" en el Municipio de Veracruz, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Por parte de "**EL H. AYUNTAMIENTO**" comparecen en este acto el Ing. Héctor Salazar y Hernández, en su calidad de coordinador de supervisión y ARQ. SUSANA ALEJANDRA RUIZ ANELL en su calidad de supervisor, ambos, designados por el Arq. Julio César Torres Sánchez Director de Obras Públicas y Desarrollo Urbano y por parte de "**EL CONTRATISTA**", el C. MAYTE RIVERA MUÑOZ en su calidad de representante legal.


**PRIMERO. ANTECEDENTES**

- I. Con fecha 16 DE FEBRERO DE 2024, "**EL H. AYUNTAMIENTO**", representado por el Síndico Único **C. P. Manuel Rivera Polanco**, asistido por el **Arq. Julio César Torres Sánchez** Director de Obras Públicas y Desarrollo Urbano y "**EL CONTRATISTA**" **GO CONSTRUCTORES DEL GOLFO, S.A. DE C.V.**, representada por el C. MAYTE RIVERA MUÑOZ, celebraron el contrato número **MVER-2024-RM-0501**, referente a los trabajos: "Trabajos extraordinarios de la rehabilitación del parque Superación Ciudadana, col. Cándido Aguilar, Veracruz, Veracruz de Ignacio de la Llave"; en el Municipio de Veracruz, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
- II. Con de fecha 02 DE MARZO DE 2024, mediante aviso de terminación, "**EL CONTRATISTA**" comunicó a "**EL H. AYUNTAMIENTO**", la conclusión de los trabajos objeto del contrato referido en el antecedente primero.
- III. Con fecha 07 DE MARZO DE 2024, "**EL H. AYUNTAMIENTO**", finalizó la verificación de los trabajos terminados, no encontrando deficiencia aparente alguna durante la inspección realizada.

**SEGUNDO. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN:**

Datos de los trabajos ejecutados:

MONTO TOTAL EJERCIDO C / IVA:	FECHA DE INICIO:	FECHA DE TERMINO:	PERÍODO DE EJECUCIÓN:
\$ 300,000.00	17 DE FEBRERO DE 2024	02 DE MARZO DE 2024	15 DÍAS NATURALES

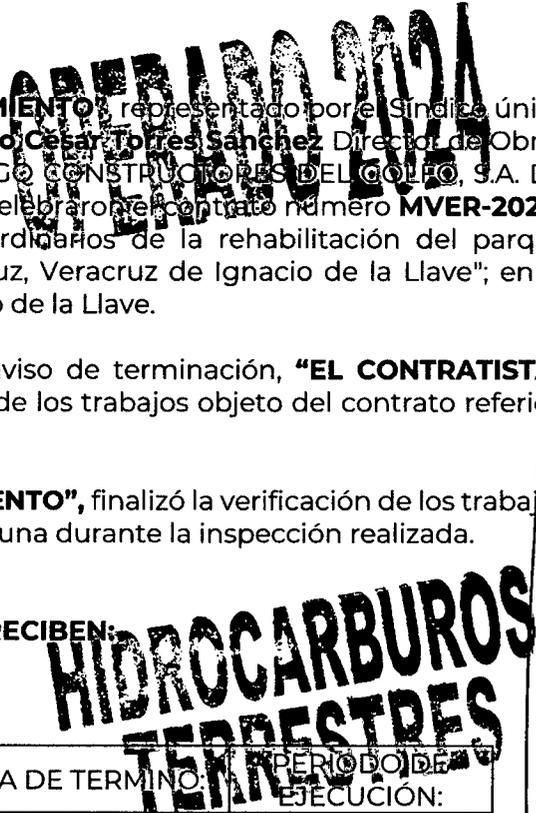



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VERACRUZ  
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

CONTRATO No. MVER-2024-RM-0501

OBRA O SERVICIO No. 2024301930501

ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS

**Convenios que sustituyeran o cambiaran total o parcialmente los trabajos contratados:**

No hubo convenios modificatorios que sustituyeran o cambiaran total o parcialmente el contrato pactado.

El monto total ejercido, cuyo objeto son los trabajos que se describen en la presente acta, asciende a la cantidad de **\$ 300,000.00 (Trescientos mil pesos 00/100 M.N.)**, incluido el Impuesto al Valor Agregado.

**Volúmenes y unidades de trabajo ejecutados:**

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VOLÚMEN REAL EJECUTADO
<b>ÁREA DE CONVIVENCIA</b>			
MVER-SC-05-033	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUEGO BÁSICO DE METAL DE 607X498X3.55 METROS PARA NIÑOS DE 6 A 12 AÑOS, PLAYCLUB MODELO 4MET50 O SIMILAR (UNA RESBALADILLA RECTA, UNA CANASTA DE BALONCESTO, DOS COLUMPIOS, UN PUENTE CON BARANDAL, UN TUBO DESLIZANTE DE BOMBEROS Y TREPADORES DE CUERDA). INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00
<b>APARATOS EJERCITADORES</b>			
MVER-SC-06-044	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EJERCITADOR CLÁSICO DE ABDOMINALES DOBLE EN METAL DE 1.37X1.46X0.66 METROS, PLAYCLUB MODELO E22AB-TUB O SIMILAR. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00
MVER-SC-06-046	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EJERCITADOR CLÁSICO TONIFICADOR DE PIERNAS EN METAL DE 2.02X0.69X2.06 METROS, PLAYCLUB MODELO E27TON-TUB O SIMILAR. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00
<b>REFLECTORES PARA ILUMINACIÓN DE CANCHAS</b>			
MVER-SC-10-066	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIO REFLECTOR LED 400W 42,000 LÚMENES, TENSIÓN NOMINAL 85-305V, TEMPERATURA 6500K TECNOLED ML-RPS-400WSMD, MATERIAL ALUMINIO, TERMINADO PLATA, INCLUYE: BASE DE CONCRETO DE SECCIÓN SEGÚN DETALLE CON CONCRETO FC=150 KG/CM <sup>2</sup> AGREGADO MÁXIMO 3/4", REFORZADO CON 4 VARILLAS DEL NO. 3 (3/8") Y ESTRIBOS DEL NO. 2 A CADA 20 CM, MISMA QUE SEPA ENTERRADA 40 CM Y SOBRE SALDRÁN 10 CM EN DONDE SE DEJARA LA PREPARACIÓN DE DOS ANCLAS PARA SUJETAR LA LUMINARIA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	4.00
MVER-SC-10-068	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CRUCETA DE SOPORTE PARA LUMINARIOS LED, EN POSTE DE 11 METROS. INCLUYE: IZADO A	PZA	1.00



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VERACRUZ  
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

CONTRATO No. MVER-2024-RM-0501

OBRA O SERVICIO No. 2024301930501



ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS

	11 METROS DE ALTURA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN Y SERVICIO.		
MVER-SC-16-079	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE MULTIPLE PE AEREO 2+1 CAL. 6 COLOR NEGRO DE LA MARCA CONDUMEX, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, INSTALACIÓN, PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	319.10
MVER-SC-16-080	ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DESDE LA ACOMETIDA AL CENTRO DE CARGA, CON TUBERIA CONDUIT PVC Y CABLE THW CAL 8, INCLUYE: BASE PARA MEDIDOR, MUFA, TUBO GALVANIZADO Y VARILLA COPPERWELD PARA TIERRA, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00
MVER-SC-16-081	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENTRO DE CARGA 8 POLOS BIFÁSICO DE SOBREPONER 100A MCA. SQUAER D, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, INSTALACIÓN, PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00
MVER-SC-16-082	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENTRO DE CARGA 2 POLOS BIFÁSICO DE SOBREPONER 70A MCA. SQUAER D, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, INSTALACIÓN, PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00
MVER-SC-16-083	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO 2 POLOS 70 A, MARCA SQUAER D, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, INSTALACIÓN, PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	2.00
MVER-SC-16-084	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FOTOCELDA CON INTERRUPTOR 120-240V ARGOS, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, INSTALACIÓN, PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00
MVER-SC-16-085	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO 2 POLOS 30 A, MARCA SQUAER D O SIMILAR. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, INSTALACIÓN, PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00
MVER-SC-16-086	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO 1 POLO 30 A, MARCA SQUAER D O SIMILAR. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, INSTALACIÓN, PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00
MVER-SC-16-087	DESCONEXIÓN DE REFLECTORES DE 400W DEL CIRCUITO EXISTENTE Y RECONEXIÓN AL NUEVO CIRCUITO A UNA ALTURA DE HASTA 9.00M, INCLUYE HASTA 2.00 M DE CABLE AGW. CAL. 10, CONECTORES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN.	PZA	14.00
MVER-SC-16-088	APLICACIÓN DE PINTURA TIPO DEPORTIVA, SEGÚN COLOR AUTORIZADO EN OBRA, INCLUYE UNA MANO DE SEELLADOR Y DOS MANOS DE PINTURA SEGÚN ESPECIFICACIÓN DEL	M2	248.07

**OTORGADO 2024**

**HIDROCARBUROS TERRESTRES**



**VERACRUZ**

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VERACRUZ  
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE**

**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO**

**CONTRATO No. MVER-2024-RM-0501**

**OBRA O SERVICIO No. 2024301930501**

**SUBDIRECCIÓN DE  
OBRAS PÚBLICAS**

**ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS**

	FABRICANTE CUANTIFICANDO SOLO EL ÁREA EFECTIVA TRABAJADA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, FLETES, MANIOBRAS, CONSUMIBLES, ACARREOS, DESPERDICIOS, PROTECCIÓN DE SUPERFICIES ADYACENTES, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBRANTES AL LUGAR AUTORIZADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		
--	--	--	--

**CUARTO. RELACIÓN DE ESTIMACIONES O GASTOS APROBADOS**

Las partes están de acuerdo que, a la fecha de recepción de los trabajos, las estimaciones y gastos aprobados del contrato mencionado en el punto PRIMERO fracción I de la presente acta, se realizaron con base en las cantidades siguientes:

CONCEPTO	TOTAL C / IVA
ANTICIPO	\$ 0.00
ESTIMACIÓN Y FINIQUITO	\$ 300,000.00

**Estimaciones pendientes de autorización:**

No hay estimaciones pendientes de autorización

**QUINTO. DOCUMENTACIÓN SOPORTE**

“EL CONTRATISTA” manifiesta que entregó en tiempo y forma, a la residencia o supervisión, la documentación derivada de la realización de los trabajos, misma que a partir de este momento queda bajo resguardo de “EL H. AYUNTAMIENTO” y se anexa al expediente técnico unitario.

**SEXTO. FIANZA**

“EL CONTRATISTA”, exhibirá, previo a la firma del finiquito, la garantía por defectos y vicios ocultos prevista en el artículo 66 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, misma que estará vigente por un periodo de 12 meses a partir de la fecha de firma de este documento.

**SÉPTIMO. FINIQUITO QUE EXTINGUE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES**

Para dar por terminados totalmente los derechos y obligaciones asumidas por las partes derivados del contrato mencionado en el punto primero, será otorgado el finiquito dentro de los 10 (Diez) días naturales siguientes a la fecha de elaboración de la presente acta.

**HIDROCARBUROS  
TERRESTRES**

Calle Juan de Grijalva No. 34  
Fracc. Reforma Veracruz, Ver  
229 200 22 49  
veracruzmunipio.gob.mx

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.

Esta obra fue realizada con recursos públicos federales





**VERA  
CRUZ**  
NUESTRO PUERTO, NUESTRA CASA

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VERACRUZ  
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE**

**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO**

**CONTRATO No. MVER-2024-RM-0501**

**OBRA O SERVICIO No. 2024301930501**

**ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS**



Quedan de acuerdo las partes que el FINIQUITO se celebre en punto de las 09:00 horas del día 01 DE ABRIL DE 2024, en el domicilio de la Subdirección de Obras Públicas.

No habiendo otro asunto que tratar y enteradas las partes del contenido y alcance legal de la presente acta, se cierra a las 09:30 horas del día de su apertura, suscribiéndola los comparecientes en 5 (cinco) tantos, para los efectos legales a que haya lugar.

<p align="center"><b><u>POR "EL H. AYUNTAMIENTO"</u></b></p>   <p align="center"><b>ING. HECTOR SALAZAR Y HERNÁNDEZ COORDINADOR DE SUPERVISIÓN</b></p>	<p align="center"><b><u>POR "EL H. AYUNTAMIENTO"</u></b></p>   <p align="center"><b>ARO. SUSANA ALEJANDRA RUIZ ANELL SUPERVISOR</b></p> 
--	---

**POR "EL CONTRATISTA"**


**C. MAYTE RIVERA MUÑOZ  
REPRESENTANTE LEGAL  
GQ CONSTRUCTORES DEL GOLFO, S.A. DE C.V.**

**HIDROCARBUROS  
TERRESTRES**

