




H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VERACRUZ
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO



CONTRATO No. MVER-2025-RM-0109
OBRA O SERVICIO No. 2025301930109

ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS

En la Ciudad de Veracruz, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, siendo las 09:00 horas del día 19 DE JUNIO DE 2025 y con fundamento en el artículo 68 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y artículos 210 y 212 de su Reglamento, se emite la presente **ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS** correspondientes al contrato No. **MVER-2025-RM-0109** referentes a **"REHABILITACIONES DE TERRACERÍAS, OBRAS DE DRENAJE Y PAVIMENTOS AFECTADOS POR HUNDIMIENTOS, SOCAVONES Y DESLIZAMIENTOS DE TALUDES EN COLONIAS Y FRACCIONAMIENTOS, PRIMERA ETAPA, VERACRUZ, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE"** en el Municipio de Veracruz, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Por parte de **"EL H. AYUNTAMIENTO"** comparecen en este acto la Arq. María Enedina Olimpia Mata Hernández, en su calidad de coordinadora de supervisión y ARQ. MIGUEL ANGEL CRUZ CALLEJA en su calidad de supervisor, ambos, designados por el Arq. Julio César Torres Sánchez Director de Obras Públicas y Desarrollo Urbano y por parte de **"EL CONTRATISTA"**, el C. ARISTIDES EFRAIN MANTILLA SOLANA en su calidad de representante legal.


PRIMERO. ANTECEDENTES

- I. Con fecha 22 DE ABRIL DE 2025, **"EL H. AYUNTAMIENTO"**; representado por el Síndico único **C. P. Manuel Rivera Polanco**, asistido por el Arq. **Julio César Torres Sánchez** Director de Obras Públicas y Desarrollo Urbano y **"EL CONTRATISTA"** ARITILLA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., representada por el C. ARISTIDES EFRAIN MANTILLA SOLANA, celebraron el contrato número **MVER-2025-RM-0109**, referente a los trabajos: **"REHABILITACIONES DE TERRACERÍAS, OBRAS DE DRENAJE Y PAVIMENTOS AFECTADOS POR HUNDIMIENTOS, SOCAVONES Y DESLIZAMIENTOS DE TALUDES EN COLONIAS Y FRACCIONAMIENTOS, PRIMERA ETAPA, VERACRUZ, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE"**; en el Municipio de Veracruz, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
- II. Con fecha 22 DE MAYO DE 2025, **"EL H. AYUNTAMIENTO"** y **"EL CONTRATISTA"** celebraron el convenio modificadorio No.1, mediante el cual se formalizó una modificación al catálogo de conceptos originalmente pactado, sin modificar el monto ni plazo contratados.



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VERACRUZ
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO



CONTRATO No. MVER-2025-RM-0109
OBRA O SERVICIO No. 2025301930109

ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS

- III. Con fecha 06 DE JUNIO DE 2025, mediante aviso de terminación, "EL CONTRATISTA" comunicó a "EL H. AYUNTAMIENTO", la conclusión de los trabajos objeto del contrato referido en el antecedente primero.
- IV. Con fecha 16 DE JUNIO DE 2025, "EL H. AYUNTAMIENTO", finalizó la verificación de los trabajos terminados, no encontrando deficiencia aparente alguna durante la inspección realizada.

SEGUNDO. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN

Datos de los trabajos ejecutados:

MONTO TOTAL EJERCIDO C / IVA:	FECHA DE INICIO:	FECHA DE TERMINO:	PERIODO DE EJECUCIÓN:
\$ 4,398,397.58	23 DE ABRIL DE 2025	06 DE JUNIO DE 2025	45 DÍAS NATURALES

Convenios que sustituyeran o cambiaran total o parcialmente los trabajos contratados:

CONVENIO MODIFICATORIO NO. 1, mediante el cual se formalizó una modificación al catálogo de conceptos originalmente pactado, sin modificar el monto ni plazo contratados.

FECHA DE FORMALIZACIÓN:	MONTO DEL CONVENIO:	PLAZO DEL CONVENIO:
22 DE MAYO DE 2025	MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL	PLAZO DEL CONTRATO ORIGINAL

El monto total ejercido, cuyo objeto son los trabajos que se describen en la presente acta, asciende a la cantidad de \$ 4,398,397.58 (Cuatro millones trescientos noventa y ocho mil trescientos noventa y siete pesos 58/100 M.N.), incluido el Impuesto al Valor Agregado.

FAISMUN

[Handwritten signature]
Página 2 de 10



VERACRUZ
HERISTRO PLUFITO, NUESTRA CASA

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VERACRUZ
 ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE**

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

**CONTRATO No. MVER-2025-RM-0109
 OBRA O SERVICIO No. 2025301930109**

ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS

2022 2025

**SUBDIRECCIÓN DE
OBRA PÚBLICAS**

Volúmenes y unidades de trabajo ejecutados:

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VOLÚMEN REAL EJECUTADO
PRELIMINARES			
MVER-SOND-0001	TRABAJOS DE SONDEO, MEDIANTE CORTE DEL PAVIMENTO DEL ÁREA AFECTADA, PARA LA DETERMINACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA Y POSIBLE SOLUCIÓN AL PROBLEMA, VERIFICANDO EL ORIGEN DEL HUNDIMIENTO, LIMPIEZA DE REGISTROS PLUVIALES, Y RECOPIAR INFORMACIÓN DE LAS LÍNEAS EXISTENTE EN LA ZONA, INCLUYE: EXCAVACIÓN HASTA 0.60CM DE ESPESOR, RELLENO CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN Y SEÑALIZACIÓN DEL ÁREA, MATERIALES Y EQUIPO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN	M2	957.02
MVER-TRZ-01	TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO PLANO POR MEDIOS MANUALES PARA ESTABLECER EJES AUXILIARES Y REFERENCIAS. INCLUYE SEÑALIZACIÓN PARA TRABAJOS REALIZADOS EN VÍA PÚBLICA.	M2	957.02
MVER-CRT-PRE-001	CORTE CON CORTADORA DE DISCO DE DIAMANTE, INCLUYE: INCLUYE SEÑALIZACIÓN PARA TRABAJOS REALIZADOS EN VÍA PÚBLICA, MANO DE OBRA, MATERIALES, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	294.21
MVER-PAV-059-0010	RUPTURA Y DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO POR MEDIOS MECÁNICOS, INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	111.30
MVER-DEM-008	DEMOLICIÓN A MANO DE PISO O BANQUETA DE CONCRETO SIMPLE, INCLUYE: APILE DEL MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. INCLUYE SEÑALIZACIÓN PARA TRABAJOS REALIZADOS EN VÍA PÚBLICA.	M2	3.90
MVER-DEM-015	DEMOLICIÓN A MANO DE PISO O BANQUETA DE CONCRETO ARMADO, INCLUYE: APILE DEL MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. INCLUYE SEÑALIZACIÓN PARA TRABAJOS REALIZADOS EN VÍA PÚBLICA.	M2	0.00
MVER-EXC-009-0001	EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN MATERIAL TIPO II DE 0.00 A 3.00 M., DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	675.86
MVER-EXC-009-0002	EXCAVACIÓN A MANO EN CEPAS MATERIAL SECO TIPO II, DE PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M., INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	168.96

OPERARIO FAISMUN

Página 3 de 10



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VERACRUZ
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

HUESTRO PUERTO, NUESTRA CASA

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

2022 2025



SUBDIRECCIÓN DE
OBRA PÚBLICAS



CONTRATO No. MVER-2025-RM-0109
OBRA O SERVICIO No. 2025301930109

ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS

MVER-REL-003-0008	RELLENO EN CEPAS CON MATERIAL DE BANCO, COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON COMPACTADOR MANUAL (BAILARINA), INCLUYE: VOLTEO CON PALA.	M3	1,563.25
MVER-BAS-061-0004	OPERACIÓN DE MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTACIÓN DE BASE, COMPACTADO AL 95 % DE SU P.V.S.M., INCLUYE: SUMINISTRO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	279.12
ACARREOS			
MVER-ACA1-004	ACARREO EN CAMIÓN 1ER. KILÓMETRO, DE MATERIAL MIXTO EN CAMINO PLANO PAVIMENTADO, INCLUYE CARGA MANUAL.	M3	956.12
MVER-ACA-089-0008.3	ACARREO EN CAMIÓN KILÓMETRO SUBSECUENTE, DE MATERIAL MIXTO EN CAMINO PLANO PAVIMENTADO, INCLUYE ABUNDAMIENTO.	M3-KM	7,648.96
OBRA COMPLEMENTARIA			
MVER-BOMACH-001	BOMBEO DE ACHIQUE CON BOMBA DE 100 MM (4"). INCLUYE: MANO DE OBRA Y EQUIPO. INCLUYE SEÑALIZACIÓN PARA TRABAJOS REALIZADOS EN VÍA PÚBLICA.	HR	0.00
MVER-POZ-020-0012.1	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCAL CON TAPA DE 60 CM DE DIÁMETRO, PARA POZO DE VISITA DE HIERRO DÚCTIL MARCA SIMEX O SIMILAR, EMPOTRADA EN CADENA DE CONCRETO ARMADO DE SECCIÓN 0.20 X 0.30 M, ARMADA CON 3 VS #3 Y ESTRIBOS CON VS#2 @ 0.20M, CONCRETO F'C=200KG/CM2, INCLUYE: FLETES, MANIOBRAS DE CARGA Y DESCARGA, ALMACENAMIENTO DE MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	6.00
PAVIMENTO Y ALBAÑILERÍA			
MVER-PAV-ASF-001	CARPETA ASFÁLTICA CON MEZCLA EN CALIENTE CONSTRUIDO CON MATERIAL PÉTRICO DE BANCO, INCLUYE ACARREOS DE PRÉSTAMO DE BANCO DE ACUERDO A LA NORMA N-CTR-CAR-1-01-013/00. CARPETA ASFÁLTICA COMPACTADA AL 95 %, PUOT, CON ASFALTO EKBE SUPERPAVE PG 64-22 Y AGREGADO PÉTRICO DE 3/4" A FINOS, INCLUYE: HUMECTACIÓN DE SUPERFICIE PARA EVITAR POLVO Y COMPACTACIÓN AL 95% DE LA PRUEBA VRS., INCLUYE ACARREO DE MEZCLA ASFÁLTICA DE PLANTA DE ASFALTO AL CENTRO DE GRAVEDAD DE LA OBRA. INCLUYE SEÑALIZACIÓN PARA TRABAJOS REALIZADOS EN VÍA PÚBLICA.	M3	110.62
MVER-BAN-056-0006.6	BANQUETA DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=150 KG/CM2. AGREGADO MÁXIMO DE 3/4", DE 10 CM. DE ESPESOR, ACABADO ESCOBILLADO, INCLUYE SUMINISTROS, VOLTEADOR, CIMBRA EN FRONTERAS, DESCIMBRADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. INCLUYE SEÑALIZACIÓN PARA TRABAJOS REALIZADOS EN VÍA PÚBLICA.	M2	0.96

PERIODO 2025

FAISMUN

20



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VERACRUZ
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

NUUESTRO PUERTO, NUESTRA CASA

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

2022 2025



VERACRUZ

SUBDIRECCIÓN DE
OBRA PÚBLICAS



CONTRATO No. MVER-2025-RM-0109
OBRA O SERVICIO No. 2025301930109

ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS

MVER-BAN- 056-0006.8	BANQUETA ARMADA DE CONCRETE EN OBRA DE F'C=200 KG/CM2 AGREGADO MÁXIMO DE 3/4", DE 10 CM DE ESPESOR, Y VARILLAS DEL NO. 4 @ 12 EN AMBOS SENTIDOS ACABADO ESCOBILLADO, INCLUYE: SUMINISTROS, VOLTEADOR, CIMBRA EN FRONTERAS, CIMBRA EN LOSAS, DESCIMBRADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. INCLUYE SEÑALIZACIÓN PARA TRABAJOS REALIZADOS EN VÍA PÚBLICA.	M2	2.33
MVER-LIMF- 001	LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA, RETIRO DE ESCOMBRO PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN Y EXCAVACIÓN, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. INCLUYE SEÑALIZACIÓN PARA TRABAJOS REALIZADOS EN VÍA PÚBLICA.	M2	957.02
EXTRAORDINARIO			
EXT-01	RETIRO DE REJILLA PLUVIAL EXISTENTE EN MAL ESTADO SIN RECUPERACIÓN DE ACERO. INCLUYE RETIRO DE MATERIAL DE DESPERDICIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	9.54
EXT-02	ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE REJILLA PLUVIAL DE 1.20 M X 6.75 M. LA REJILLA CONSTA DE 1 CONTRAMARCO DE 1.20 X 6.75 M ELABORADO CON ÁNGULOS DE 3" X 1/4". TAMBIÉN INCLUYE 6 MÓDULOS DE REJILLAS PLUVIALES DE 1.1 M X 0.94 M ELABORADOS A BASE DE UN MARCO DE SOLERA DE 2 1/2" X 1/4" Y REJILLAS EN AMBOS SENTIDOS FORMANDO RECTÁNGULOS DE 6 X 8.5 CM PARA EL DESALOJO DEL AGUA PLUVIAL. EL PRECIO INCLUYE: HABILITADO DE ACERO, CORTES, SOLDADURA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ANCLAJE DE MARCO Y CONTRAMARCO A ESTRUCTURA DE TRAGATORMENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00
EXT-03	ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE REJILLA PLUVIAL DE 1.20 M X 7.70 M. LA REJILLA CONSTA DE 1 CONTRAMARCO DE 1.20 X 7.70 M ELABORADO CON ÁNGULOS DE 3" X 1/4". TAMBIÉN INCLUYE 7 MÓDULOS DE REJILLAS PLUVIALES DE 1.1 M X 0.94 M ELABORADOS A BASE DE UN MARCO DE SOLERA DE 2 1/2" X 1/4" Y REJILLAS EN AMBOS SENTIDOS FORMANDO RECTÁNGULOS DE 6 X 8.5 CM PARA EL DESALOJO DEL AGUA PLUVIAL. EL PRECIO INCLUYE: HABILITADO DE ACERO, CORTES, SOLDADURA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ANCLAJE DE MARCO Y CONTRAMARCO A ESTRUCTURA DE TRAGATORMENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00
EXT-04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE 8" Ø, MEDIANTE TUBERÍA DE PVC SISTEMA ANGER,	ML	31.70

FAIS MUN

ABRIL 2025



VERACRUZ
MUESTRO PUERTO, MUESTRA CARA

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VERACRUZ
 ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE**

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

2022 2025



VERACRUZ
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

**SUBDIRECCIÓN DE
 OBRA PÚBLICAS**



**CONTRATO No. MVER-2025-RM-0109
 OBRA O SERVICIO No. 2025301930109**

ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS

	PARA ALCANTARILLADO SERIE 20 MÉTRICA DE LA MARCA DURMAN, O DE SIMILARES O SUPERIORES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y QUE CUMPLA CON LA NOM-001-CONAGUA-2011, NMX-E-215/1-VIGENTE, INCLUYE: TUBERÍA DE PVC SERIE 20, MATERIALES MISCELÁNEOS PARA INSTALACIÓN, MANO DE OBRA PARA CORTE, HABILITADO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA, HERRAMIENTA MENOR, ACARREO A PRIMERA ESTACIÓN 20 MTS., FLETES Y MANIOBRAS, DESPERDICIOS, MERMAS Y DEMÁS CARGOS CORRESPONDIENTES POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.		
EXT-05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE 12" Ø, MEDIANTE TUBERÍA DE PVC SISTEMA ANGER, PARA ALCANTARILLADO SERIE 20 MÉTRICA DE LA MARCA DURMAN, O DE SIMILARES O SUPERIORES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y QUE CUMPLA CON LA NOM-001-CONAGUA-2011, NMX-E-215/1-VIGENTE, INCLUYE: TUBERÍA DE PVC SERIE 20, MATERIALES MISCELÁNEOS PARA INSTALACIÓN, MANO DE OBRA PARA CORTE, HABILITADO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA, HERRAMIENTA MENOR, ACARREO A PRIMERA ESTACIÓN 20 MTS., FLETES Y MANIOBRAS, DESPERDICIOS, MERMAS Y DEMÁS CARGOS CORRESPONDIENTES POR UNIDAD OBRA TERMINADA.	ML	5.70
EXT-06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE 20" Ø, MEDIANTE TUBERÍA DE PVC SISTEMA ANGER, PARA ALCANTARILLADO SERIE 20 MÉTRICA DE LA MARCA DURMAN, O DE SIMILARES O SUPERIORES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y QUE CUMPLA CON LA NOM-001-CONAGUA-2011, NMX-E-215/1-VIGENTE, INCLUYE: TUBERÍA DE PVC SERIE 20, MATERIALES MISCELÁNEOS PARA INSTALACIÓN, MANO DE OBRA PARA CORTE, HABILITADO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA, HERRAMIENTA MENOR, ACARREO A PRIMERA ESTACIÓN 20 MTS., FLETES Y MANIOBRAS, DESPERDICIOS, MERMAS Y DEMÁS CARGOS CORRESPONDIENTES POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	ML	7.98
EXT-07	ELABORACIÓN DE CONCRETO NORMAL PARA DESPLANTE DE DIVERSOS ELEMENTOS CON CONCRETO F'c=100 KG/CM2 ACABADO APARENTE, CON ESPESOR DE 5 CM, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO Y MANO DE OBRA NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	M2	8.40
EXT-08	HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 KG/CM2 EN DIÁMETROS DE HASTA 5/8", INCLUYE: HABILITADO, ARMADO, GANCHOS, TRASLAPES, DESPERDICIOS, ACARREO A 1A. ESTACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	TON	0.22

RECIBIDO 2025
FAISMUN



VERACRUZ
HEREDERO PLURIFORME, HUFISTRA CARRA

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VERACRUZ
 ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE**

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

**CONTRATO No. MVER-2025-RM-0109
 OBRA O SERVICIO No. 2025301930109**

2022 2025





VERACRUZ

**SUBDIRECCIÓN DE
 OBRA PÚBLICAS**



ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS

EXT-09	ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'c=250 KG/CM2, EDAD A 28 DÍAS REV. 10 +/- 2 CMS TMA 3/4" ELABORADO CON CEMENTO CPC40RS, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ELEMENTOS PLUVIALES DE CONCRETO. INCLUYE, MATERIALES, MANO DE OBRA, VIBRADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	3.69
EXT-10	CIMBRA ACABADO COMÚN EN MURO, INCLUYE: MATERIALES Y MANO DE OBRA.	M2	12.83
EXT-11	CONEXIÓN A POZO DE VISITA PARA TUBERÍA DE 8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MANGA DE EMPOTRAMIENTO PARA TUBERÍA, RUPTURA, ENCOFRADO, BLOQUEO DE APORTACIONES, BOMBEO, EMBOQUILLADO CON MORTERO 1:3 Y SELLADO CON IMPERMEABILIZANTE.	PZA	1.00
EXT-12	CONEXIÓN A POZO DE VISITA PARA TUBERÍA DE 10" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MANGA DE EMPOTRAMIENTO PARA TUBERÍA, RUPTURA, ENCOFRADO, BLOQUEO DE APORTACIONES, BOMBEO, EMBOQUILLADO CON MORTERO 1:3 Y SELLADO CON IMPERMEABILIZANTE.	PZA	1.00
EXT-13	ELABORACIÓN DE GUARNICIÓN TRAPEZOIDAL DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'c=150 KG/CM2. AGREGADO MÁXIMO 3/4", REVENIMIENTO 10 A 12 CENTÍMETROS, DE 15 X 20 X 40 CM. DE SECCIÓN, INCLUYE: CIMBRA METÁLICA, DESCIMBRADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	73.30
EXT-14	DESZOLVE Y LIMPIEZA DE MANERA MANUAL DE TRAGATORMENTA DE 0.90 M DE LARGO X 1.00 M ANCHO. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	18.12
EXT-15	DESZOLVE Y LIMPIEZA DE MANERA MANUAL DE CAJA PLUVIAL DE 0.90 M X 1.50 M X 1.00 M. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	1.50
EXT-16	DESZOLVE Y LIMPIEZA DE MANERA MANUAL DE CAJA PLUVIAL DE 0.87 M X 1.50 M X 1.00 M. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	1.31
EXT-17	DESZOLVE Y LIMPIEZA DE MANERA MANUAL DE CAJA PLUVIAL DE 0.82 M X 1.55 M X 1.53 M. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	1.94

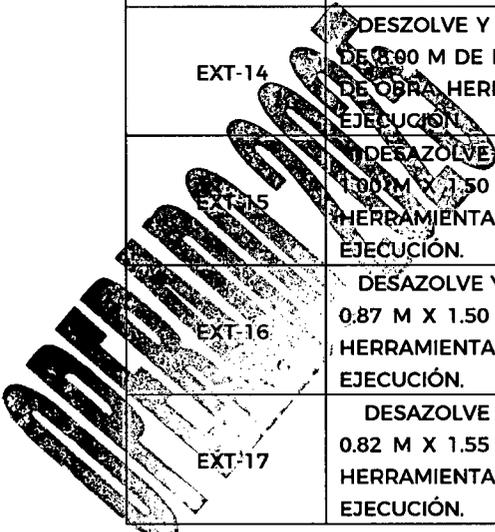



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VERACRUZ
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

2022 2025



SUBDIRECCIÓN DE
OBRA PÚBLICAS



CONTRATO No. MVER-2025-RM-0109
OBRA O SERVICIO No. 2025301930109

ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS


EXT-18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE 10" Ø, MEDIANTE TUBERÍA DE PVC SISTEMA ANGER, PARA ALCANTARILLADO SERIE 20 MÉTRICA DE LA MARCA DURMAN, O DE SIMILARES O SUPERIORES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y QUE CUMPLA CON LA NOM-001-CONAGUA-2011, NMX-E-215/1-VIGENTE. INCLUYE: TUBERÍA DE PVC SERIE 20, MATERIALES MISCELÁNEOS PARA INSTALACIÓN, MANO DE OBRA PARA CORTE, HABILITADO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA, HERRAMIENTA MENOR, ACARRÉ, PRIMERA ESTACIÓN 20 MTS., FLETES Y MANIOBRAS, DESPERDILLOS, PÉRDIDAS Y DEMÁS CARGOS CORRESPONDIENTES POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	ML	6.00
EXT-19	ELABORACIÓN DE TAPA DE CONCRETO DE 10 CM DE ESPESOR PARA CAJA PLUVIAL FABRICADA CON CONCRETO HECHO EN OBRA F' C=200 KG/CM2, REFORZADA CON VARILLAS DE 3/8" @15 EN AMBAS DIRECCIONES. MEDIDAS 1.00 M X 1.50 M, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00
EXT-20	ELABORACIÓN DE TAPA DE CONCRETO DE 10 CM DE ESPESOR PARA CAJA PLUVIAL FABRICADA CON CONCRETO HECHO EN OBRA F' C=200 KG/CM2, REFORZADA CON VARILLAS DE 3/8" @15 EN AMBAS DIRECCIONES. MEDIDAS 0.87 M X 1.50 M, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00
EXT-21	ELABORACIÓN DE TAPA DE CONCRETO DE 10 CM DE ESPESOR PARA CAJA PLUVIAL FABRICADA CON CONCRETO HECHO EN OBRA F' C=200 KG/CM2, REFORZADA CON VARILLAS DE 3/8" @15 EN AMBAS DIRECCIONES. MEDIDAS 0.78 M X 0.78 M, INCLUYE MARCO DE ÁNGULO DE 1/4 X 2 1/2" Y CONTRAMARCO DE ÁNGULO DE 1/4 X 3". INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00

OPERADO 2025

FAISMUN

TERCERO. RELACIÓN DE ESTIMACIONES O GASTOS APROBADOS


Las partes están de acuerdo que, a la fecha de recepción de los trabajos, las estimaciones y gastos aprobados del contrato mencionado en el punto PRIMERO fracción I de la presente acta, se realizaron con base en las cantidades siguientes:



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VERACRUZ
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

NUUESTRO PUERTO, NUESTRA CASA

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO




CONTRATO No. MVER-2025-RM-0109
OBRA O SERVICIO No. 2025301930109

ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS

CONCEPTO	TOTAL C / IVA
ANTICIPO	\$ 1,319,519.27
ESTIMACIÓN 1	\$415,402.37
ESTIMACIÓN 2	\$2,717,172.38
ESTIMACIÓN 1 EXTRAORDINARIA	\$443,980.01
ESTIMACIÓN 3 FINIQUITO	\$821,842.82

Estimaciones pendientes de autorización:

No hay estimaciones pendientes de autorización



CUARTO. DOCUMENTACIÓN SOPORTE

“EL CONTRATISTA” manifiesta que entregó en tiempo y forma, a la residencia o supervisión, la documentación derivada de la realización de los trabajos, misma que a partir de este momento queda bajo resguardo de “EL H. AYUNTAMIENTO” y se anexa al expediente técnico unitario.

QUINTO. FIANZA

“EL CONTRATISTA”, exhibirá, previo a la firma del finiquito, la garantía por defectos y vicios ocultos prevista en el artículo 69 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz, misma que estará vigente por un periodo de 12 meses a partir de la fecha de firma de este documento.




SEXTO. FINIQUITO QUE EXTINGUE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES

Para dar por terminados, totalmente los derechos y obligaciones asumidas por las partes derivados del contrato mencionado en el punto primero, será otorgado el finiquito dentro de los 10 (Diez) días naturales siguientes a la fecha de elaboración de la presente acta.



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VERACRUZ
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO



CONTRATO No. MVER-2025-RM-0109
OBRA O SERVICIO No. 2025301930109

ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS

Quedan de acuerdo las partes que el FINIQUITO se celebre en punto de las 09:00 horas del día 23 DE JUNIO DE 2025, en el domicilio de la Subdirección de Obras Públicas.

No habiendo otro asunto que tratar y enteradas las partes del contenido y alcance legal de la presente acta, se cierra a las 09:30 horas del día de su apertura, suscribiéndola los comparecientes en 3 (tres) tantos, para los efectos legales a que haya lugar.

<p><u>POR "EL H. AYUNTAMIENTO"</u></p>  <p>ARQ. MARÍA ENEDINA OLIMPIA MATA HERNÁNDEZ COORDINADORA DE SUPERVISIÓN</p>	<p><u>POR "EL H. AYUNTAMIENTO"</u></p>  <p>ARQ. MIGUEL ANGEL CRUZ CALLEJA SUPERVISOR</p>
--	---

POR "EL CONTRATISTA"



**C. ARISTIDES EFRAIN MANTILLA SOLANA
REPRESENTANTE LEGAL
ARITILLA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.**

FAISMUN
OPERANDO 2025
