




H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VERACRUZ  
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

CONTRATO No. MVER-2022-RM-0133

OBRA O SERVICIO No. 2022301930133




**ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS**



En la Ciudad de Veracruz, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, siendo las 12:00 horas del día 26 DE DICIEMBRE DE 2022 y con fundamento en el artículo 67 párrafo segundo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y artículos 210 y 212 de su Reglamento, se emite la presente **ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS** correspondientes al contrato No. **MVER-2022-RM-0133** referentes a "**Rehabilitación de hundimientos III, Veracruz, Veracruz de ignacio de la Llave**" en el Municipio de Veracruz, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Por parte de "**EL H. AYUNTAMIENTO**" comparecen en este acto el Ing. Héctor Salazar y Hernández, en su calidad de coordinador de supervisión y ARQ. PAOLA NAJERA BAEZ en su calidad de supervisor, ambos, designados por el Mtro. Luis Román Campa Pérez Director de Obras Públicas y Desarrollo Urbano y por parte de "**EL CONTRATISTA**", el (██████████) en su calidad de representante legal.

**PRIMERO. ANTECEDENTES**



- I. Con fecha 25 DE OCTUBRE DE 2022, "**EL H. AYUNTAMIENTO**", representado por el Síndico Único, **C. P. Manuel Rivera Polanco**, asistido por el **Mtro. Luis Román Campa Pérez** Director de Obras Públicas y Desarrollo Urbano y "**EL CONTRATISTA**" COPOC, S.A. DE C.V., representada por el C. (██████████) celebraron el contrato número **MVER-2022-RM-0133**, referente a los trabajos: "Rehabilitación de hundimientos III, Veracruz, Veracruz de ignacio de la Llave"; en el Municipio de Veracruz, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
- II. Con fecha 05 DE DICIEMBRE DE 2022, "**EL H. AYUNTAMIENTO**" y "**EL CONTRATISTA**" celebraron el convenio modificadorio No.1, mediante el cual se formalizó una ampliación al monto sin modificar el plazo contratado.
- III. Con de fecha 09 DE DICIEMBRE DE 2022, mediante aviso de terminación, "**EL CONTRATISTA**" comunicó a "**EL H. AYUNTAMIENTO**", la conclusión de los trabajos objeto del contrato referido en el antecedente primero.
- IV. Con fecha 14 DE DICIEMBRE DE 2022, "**EL H. AYUNTAMIENTO**", finalizó la verificación de los trabajos terminados, no encontrando deficiencia aparente alguna durante la inspección realizada.






H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VERACRUZ  
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

CONTRATO No. MVER-2022-RM-0133

OBRA O SERVICIO No. 2022301930133

ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS



**SEGUNDO. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN:**

**Datos de los trabajos ejecutados:**

MONTO TOTAL EJERCIDO C / IVA:	FECHA DE INICIO:	FECHA DE TERMINO:	PERIODO DE EJECUCIÓN:
\$ 1,014,746.15	26 DE OCTUBRA DE 2022	09 DE DICIEMBRE DE 2022	45 DÍAS NATURALES

**Convenios que sustituyeran o cambiaran total o parcialmente los trabajos contratados:**

CONVENIO MODIFICATORIO NO. 1, mediante el cual se formalizó una ampliación al monto sin modificar el plazo contratado.

FECHA DE FORMALIZACIÓN:	MONTO DEL CONVENIO:	PLAZO DEL CONVENIO:
05 DE DICIEMBRE DE 2022	14,746.15	PLAZO DEL CONTRATO ORIGINAL

El monto total ejercido, cuyo objeto son los trabajos que se describen en la presente acta, asciende a la cantidad de **\$ 1,014,746.15 (Un millón catorce mil setecientos cuarenta y seis pesos 15/100 M.N.)**, incluido el Impuesto al Valor Agregado.

**Volúmenes y unidades de trabajo ejecutados:**

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VOLUMEN REAL EJECUTADO
	PRELIMINARES		
MVER-TRZ-01	TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO PLANO POR MEDIOS MANUALES PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS ESTABLECIENDO EJES AUXILIARES Y REFERENCIAS. INCLUYE SEÑALIZACIÓN PARA TRABAJOS REALIZADOS EN VÍA PÚBLICA	M2	408.91
MVER-CRT-001	CORTE CON DISCO DE 6.35 CM. DE ESPESOR CON CORTADORA DE DISCO DIAMANTE, INCLUYE: INCLUYE SEÑALIZACIÓN PARA TRABAJOS REALIZADOS EN VÍA PÚBLICA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M	375.02
MVER-DEM-CON-001	DEMOLICIÓN A MÁQUINA DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO REFORZADO DE 15 CM. DE ESPESOR, INCLUYE APILE DEL MATERIAL, INCLUYE SEÑALIZACIÓN PARA TRABAJOS REALIZADOS EN VÍA PÚBLICA	M2	133.95
MVER-DEM-PAV-001	DEMOLICIÓN A MANO DE CONCRETO ASFALTICO, INCLUYE APILE DEL MATERIAL, INCLUYE SEÑALIZACIÓN PARA TRABAJOS REALIZADOS EN VÍA PÚBLICA	M3	3.64

FISM






H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VERACRUZ  
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

CONTRATO No. MVER-2022-RM-0133

OBRA O SERVICIO No. 2022301930133

ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS



MVER-DEM-PAV-002	DEMOLICIÓN A MÁQUINA DE CONCRETO ASFALTICO, INCLUYE APILE DEL MATERIAL, INCLUYE SEÑALIZACIÓN PARA TRABAJOS REALIZADOS EN VÍA PÚBLICA	M2	152.32
MVER-DEM-CON-002	DEMOLICIÓN A MÁQUINA DE ELEMENTOS DE CONCRETO ARMADO, INCLUYE APILE DE MATERIAL. TRABAJOS REALIZADOS EN VÍA PÚBLICA INCLUYE SEÑALIZACIÓN.	M3	0.00
MVER-DEM-CON-020	DEMOLICIÓN A MANO DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO REFORZADO DE 20 CM. DE ESPESOR INCLUYE SEÑALIZACIÓN PARA TRABAJOS REALIZADOS EN VÍA PÚBLICA	M2	78.00
MVER-EXC-MAN-001	EXCAVACIÓN A MANO EN CEPAS MATERIAL SECO TIPO II, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M., INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, INCLUYE SEÑALIZACIÓN PARA TRABAJOS REALIZADOS EN VÍA PÚBLICA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	107.57
MVER-EXC-EQ-001A	EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN MATERIAL TIPO I DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, INCLUYE SEÑALIZACIÓN PARA TRABAJOS REALIZADOS EN VÍA PÚBLICA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	322.26
MVER-BAS-002	OPERACIÓN DE MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTACIÓN DE BASE, COMPACTADO AL 95 % DE SU PVSM., INCLUYE: SUMINISTRO, INCLUYE SEÑALIZACIÓN PARA TRABAJOS REALIZADOS EN VÍA PÚBLICA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	93.14
MVER-REL-003-0008	RELLENO EN ACOSTILLADO DE TUBERÍA CON MATERIAL DE BANCO, CON COMPACTADOR MANUAL (BAILARINA), INCLUYE: VOLTEO CON PALA. INCLUYE SEÑALIZACIÓN PARA TRABAJOS REALIZADOS EN VÍA PÚBLICA	M3	32.30
MVER-RELL-001	RELLENO EN CEPAS CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN MEJORADO CON OXICAL EN PROPORCIÓN DE 40KG/M3, COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON COMPACTADOR MANUAL (BAILARINA), INCLUYE: VOLTEO CON PALA, INCLUYE SEÑALIZACIÓN PARA TRABAJOS REALIZADOS EN VÍA PÚBLICA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	203.74
MVER-ACOST-001	PLANTILLA CON MATERIAL DE BANCO PARA APOYO DE TUBERÍAS, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, INCLUYE SEÑALIZACIÓN PARA TRABAJOS REALIZADOS EN VÍA PÚBLICA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS, MEDIDO COMPACTO.	M3	15.63
MVER-PLANT-100	PLANTILLA DE 5 CM. DE ESPESOR DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'c=100 KG/CM2. AGREGADO MÁXIMO 3/4", INCLUYE: ACARREO A PRIMERA ESTACIÓN A 20.00 M., MATERIAL, INCLUYE SEÑALIZACIÓN PARA TRABAJOS REALIZADOS EN VÍA PÚBLICA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	0.00
	PRELIMINARES		
MVER-ACA1-004	ACARREO EN CAMIÓN 1ER. KILÓMETRO, DE MATERIAL MIXTO EN CAMINO PLANO PAVIMENTADO, INCLUYE CARGA MANUAL	M3	269.85
MVER-ACASUB-005	ACARREO EN CAMIÓN KILOMETRO SUBSECUENTE, DE MATERIAL MIXTO EN CAMINO PLANO PAVIMENTADO	M3	4,618.59
MVER-HN-DES02	DESAZOLVE DE ALCANTARILLAS Y TRAGA TORMENTAS, INCLUYE RETIRO DE REJILLA, LIMPIEZA, RETIRO DEL MATERIAL Y ACARREO A 1ª, ESTACIÓN, RESANE DE MUROS EN MAL ESTADO, MATERIALES, INCLUYE SEÑALIZACIÓN PARA TRABAJOS REALIZADOS EN VÍA PÚBLICA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO NECESARIO.	M	0.00
	PRELIMINARES EN HORARIO NOCTURNO		





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VERACRUZ  
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

CONTRATO No. MVER-2022-RM-0133

OBRA O SERVICIO No. 2022301930133

ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS



MVER-HN-CRT-001	CORTE CON DISCO DE 6.35 CM. DE ESPESOR CON CORTADORA DE DISCO DIAMANTE, REALIZADO EN HORARIO NOCTURNO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. INCLUYE SEÑALIZACIÓN PARA TRABAJOS REALIZADOS EN VÍA PÚBLICA	M	0.00
MVER-HN-DEM-CON-001	DEMOLICIÓN A MÁQUINA DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO REFORZADO DE 15 CM. DE ESPESOR, REALIZADO EN HORARIO NOCTURNO, INCLUYE APILE DEL MATERIAL INCLUYE SEÑALIZACIÓN PARA TRABAJOS REALIZADOS EN VÍA PÚBLICA	M2	0.00
MVER-HN-DEM-PAV-001	DEMOLICIÓN A MANO DE CONCRETO ASFALTICO, REALIZADO EN HORARIO NOCTURNO INCLUYE SEÑALIZACIÓN PARA TRABAJOS REALIZADOS EN VÍA PÚBLICA, INCLUYE APILE DEL MATERIAL	M3	0.00
MVER-HN-EXC-MAN-001	EXCAVACIÓN A MANO EN CEPAS MATERIAL SECO TIPO II, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M., REALIZADO EN HORARIO NOCTURNO INCLUYE SEÑALIZACIÓN PARA TRABAJOS REALIZADOS EN VÍA PÚBLICA, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	0.00
MVER-HN-BAS-002	OPERACIÓN DE MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTACIÓN DE BASE, COMPACTADO AL 95 % DE SU PVSM., REALIZADO EN HORARIO NOCTURNO INCLUYE SEÑALIZACIÓN PARA TRABAJOS REALIZADOS EN VÍA PÚBLICA, INCLUYE: SUMINISTRO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	0.00
MVER-HN-REL-003-0008	RELLENO EN CEPAS CON MATERIAL DE BANCO, CON COMPACTADOR MANUAL (BAILARINA), REALIZADO EN HORARIO NOCTURNO INCLUYE SEÑALIZACIÓN PARA TRABAJOS REALIZADOS EN VÍA PÚBLICA, INCLUYE: VOLTEO CON PALA.	M3	0.00
MVER-HN-ACOST-001	PLANTILLA CON MATERIAL DE BANCO PARA APOYO DE TUBERÍAS, REALIZADO EN HORARIO NOCTURNO INCLUYE SEÑALIZACIÓN PARA TRABAJOS REALIZADOS EN VÍA PÚBLICA, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS, MEDIDO COMPACTO.	M3	0.00
	OBRAS DE DRENAJE PLUVIAL		
MVER-ACER-001	ACERO DE REFUERZO DE VARIOS DIÁMETROS FY=4200KG/CM2, INCLUYE: HABILITADO, ARMADO, GANCHOS, TRASLAPES, DESPERDICIOS, ACARREO A 1A. ESTACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	KG	0.00
MVER-CIM-001	SUMINISTRO, COLOCACIÓN, CURADO Y DESMONTAJE DE CIMBRA DE MADERA DE PINO DE 3A CON ACABADO NO APARENTE, INCLUYE SEÑALIZACIÓN PARA TRABAJOS REALIZADOS EN VÍA PÚBLICA, INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA.	M2	0.00
MVER-CIM-001B	SUMINISTRO, COLOCACIÓN, CURADO Y DESMONTAJE DE CIMBRA DE MADERA DE PINO DE 1A CON ACABADO APARENTE, INCLUYE SEÑALIZACIÓN PARA TRABAJOS REALIZADOS EN VÍA PÚBLICA, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y QUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	0.00
MVER-CONC-F200	CONCRETO F'C=200 KG/CM2. AGREGADO MÁXIMO 3/4", REVENIMIENTO DE 10 CM., VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES EN CIMENTACIÓN, INCLUYE SEÑALIZACIÓN PARA TRABAJOS REALIZADOS EN VÍA PÚBLICA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	0.00
MVER-CONC-F250	CONCRETO F'C=250 KG/CM2. AGREGADO MÁXIMO 3/4", REVENIMIENTO DE 10 CM., VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES EN CIMENTACIÓN, INCLUYE SEÑALIZACIÓN PARA TRABAJOS REALIZADOS	M3	0.00

AGREGADO 2022

24




H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VERACRUZ  
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

CONTRATO No. MVER-2022-RM-0133

OBRA O SERVICIO No. 2022301930133

ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS



	EN VÍA PÚBLICA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.		
MVER-SON-POZ	SONDEO DE POZO DE VISITA EXISTENTE, PARA DESAZOLVE Y LIMPIEZA, INCLUYE SEÑALIZACIÓN PARA TRABAJOS REALIZADOS EN VÍA PÚBLICA, INCLUYE: DESAZOLVE CON EQUIPO VACTOR Y LIMPIEZA DEL MISMO.	PZA	2.00
	OBRAS DE DRENAJE PLUVIAL		
MVER-RETI-TUB-6	RETIRO DE TUBERÍA SIN RECUPERACIÓN DE CONCRETO DE 6" DE DIAM., CON EQUIPO Y DESALOJO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS INCLUYE SEÑALIZACIÓN PARA TRABAJOS REALIZADOS EN VÍA PÚBLICA	M	7.57
MVER-RETI-TUB-8	RETIRO DE TUBERÍA DE CONCRETO SIN RECUPERACIÓN DE 8" DE DIAM., CON EQUIPO Y DESALOJO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, INCLUYE SEÑALIZACIÓN PARA TRABAJOS REALIZADOS EN VÍA PÚBLICA	M	41.70
MVER-RETI-TUB-10	RETIRO DE TUBERÍA DE CONCRETO SIN RECUPERACIÓN DE 10" DE DIAM., CON EQUIPO Y DESALOJO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, INCLUYE SEÑALIZACIÓN PARA TRABAJOS REALIZADOS EN VÍA PÚBLICA	M	0.00
MVER-RETI-TUB-12	RETIRO DE TUBERÍA DE CONCRETO SIN RECUPERACIÓN DE 12" DE DIAM., CON EQUIPO Y DESALOJO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, INCLUYE SEÑALIZACIÓN PARA TRABAJOS REALIZADOS EN VÍA PÚBLICA	M	0.00
MVER-RETI-TUB-15	RETIRO DE TUBERÍA DE CONCRETO SIN RECUPERACIÓN DE 15" DE DIAM., CON EQUIPO Y DESALOJO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, INCLUYE SEÑALIZACIÓN PARA TRABAJOS REALIZADOS EN VÍA PÚBLICA	M	12.00
MVER-RET-TUB-12PAD	RETIRO DE TUBERÍA PEAD SIN RECUPERACIÓN DE 12" DE DIAM., CON EQUIPO Y DESALOJO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, INCLUYE SEÑALIZACIÓN PARA TRABAJOS REALIZADOS EN VÍA PÚBLICA	M	0.00
MVER-RET-TUB-18PAD	RETIRO DE TUBERÍA PEAD SIN RECUPERACIÓN DE 18" DE DIAM., CON EQUIPO Y DESALOJO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, INCLUYE SEÑALIZACIÓN PARA TRABAJOS REALIZADOS EN VÍA PÚBLICA	M	20.20
MVER-REJ-ACE-001	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REJILLA DE ACERO REFORZADO DE ALTO TRÁFICO PARA TRAGA TORMENTAS, INCLUYE SEÑALIZACIÓN PARA TRABAJOS REALIZADOS EN VÍA PÚBLICA	KG	0.00
MVER-DESC-SAN	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DESCARGA SANITARIA MEDIANTE TEE EN Y DE 8" X 6" Y CODO DE 45° X 6" DE DIÁMETRO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. INCLUYE SEÑALIZACIÓN PARA TRABAJOS REALIZADOS EN VÍA PÚBLICA	PZA	5.00
MVER-TUB-S20-6	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO PARA ALCANTARILLADO DE PVC S-20 SANITARIO DE 6" (15 CM.) DE DIÁMETRO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. INCLUYE SEÑALIZACIÓN PARA TRABAJOS REALIZADOS EN VÍA PÚBLICA	M	7.57
MVER-TUB-S20-8	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO PARA ALCANTARILLADO DE PVC S-20 SANITARIO DE 8" (20 CM.) DE DIÁMETRO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. INCLUYE SEÑALIZACIÓN PARA TRABAJOS REALIZADOS EN VÍA PÚBLICA	M	36.00
MVER-TUB-S20-10	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO PARA ALCANTARILLADO DE PVC S-20 SANITARIO DE 10" (25 CM.) DE DIÁMETRO, INCLUYE:		0.00

**SIN**

24




H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VERACRUZ  
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO


CONTRATO No. MVER-2022-RM-0133

OBRA O SERVICIO No. 2022301930133

ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS



	MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. INCLUYE SEÑALIZACIÓN PARA TRABAJOS REALIZADOS EN VÍA PÚBLICA		
MVER-TUB-S20-12	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO PARA ALCANTARILLADO DE PVC S-20 SANITARIO DE 12" (30 CM.) DE DIÁMETRO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. INCLUYE SEÑALIZACIÓN PARA TRABAJOS REALIZADOS EN VÍA PÚBLICA	M	12.00
MVER-TUB-PEAD-12	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADO DE 12", INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, PIEZAS Y CONEXIONES NECESARIAS PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. INCLUYE SEÑALIZACIÓN PARA TRABAJOS REALIZADOS EN VÍA PÚBLICA	M	0.00
MVER-TUB-PEAD-15	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADO DE 15", INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, PIEZAS Y CONEXIONES NECESARIAS PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. INCLUYE SEÑALIZACIÓN PARA TRABAJOS REALIZADOS EN VÍA PÚBLICA	M	0.00
MVER-TUB-PEAD-18	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADO DE 18", INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, PIEZAS Y CONEXIONES NECESARIAS PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. INCLUYE SEÑALIZACIÓN PARA TRABAJOS REALIZADOS EN VÍA PÚBLICA	M	29.20
	OBRAS DE DRENAJE PLUVIAL		
MVER-TUB-PEAD-36	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADO DE 36", INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, PIEZAS Y CONEXIONES NECESARIAS PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. INCLUYE SEÑALIZACIÓN PARA TRABAJOS REALIZADOS EN VÍA PÚBLICA	M	0.00
MVER-TAPON-006-001	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPÓN DE PVC HIDRÁULICO DE 6", INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. INCLUYE SEÑALIZACIÓN PARA TRABAJOS REALIZADOS EN VÍA PÚBLICA	PZA	0.00
MVER-REP-HID-001	REPARACIÓN DE FUGA EN TUBERÍA HIDRÁULICA DE 13 MM (1/2") DE DIÁMETRO PEAD RD-9, INCLUYE COPLE DE REPARACIÓN Y DOS ABRAZADERAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. INCLUYE SEÑALIZACIÓN PARA TRABAJOS REALIZADOS EN VÍA PÚBLICA	PZA	5.00
MVER-RENPZ-001	RENIVELACIÓN DE POZO DE VISITA EXISTENTE. INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCAL CON TAPA DE 60 CMS DE DIÁMETRO, PARA POZO DE VISITA DE HIERRO DÚCTIL MARCA SIMEX O SIMILAR EMPOTRADA EN CADENA DE CONCRETO ARMADO DE SECCIÓN 0.20X0.30M, ARMADA CON 3VS#3 Y ESTRIBOS CON VS#2@0.20M, CONCRETO F'C=200KG/CM2, CARGA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRENTE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y DEMÁS CARGOS CORRESPONDIENTES POR UNIDAD TERMINADA DE OBRA. INCLUYE SEÑALIZACIÓN PARA TRABAJOS REALIZADOS EN VÍA PÚBLICA	PZA	2.00
MVER-BOMACH-001	BOMBEO DE ACHIQUE CON BOMBA DE 100 MM (4"). INCLUYE: MANO DE OBRA Y EQUIPO. INCLUYE SEÑALIZACIÓN PARA TRABAJOS REALIZADOS EN VÍA PÚBLICA	HRS	31.00
	OBRAS DE DRENAJE PLUVIAL EN HORARIO NOCTURNO		

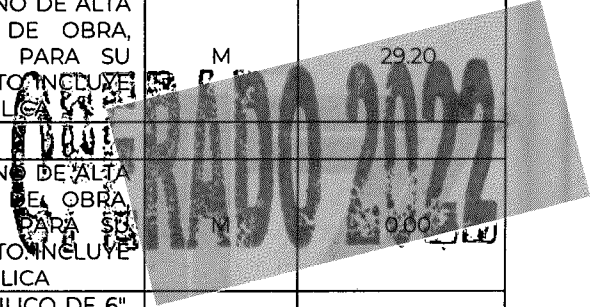




H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VERACRUZ  
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

CONTRATO No. MVER-2022-RM-0133

OBRA O SERVICIO No. 2022301930133

ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS



MVER-HN-EXC-25	EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN MATERIAL TIPO I DE 2.00 A 5.00 M. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. INCLUYE SEÑALIZACIÓN PARA TRABAJOS REALIZADOS EN VÍA PÚBLICA	M3	0.00
MVER-HN-RDE	REPARACIÓN DE DESCARGAS SANITARIAS DE CONCRETO, CON TUBERÍA DE PVC DE 4", INCLUYE: EXCAVACIÓN, RELLENOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. INCLUYE SEÑALIZACIÓN PARA TRABAJOS REALIZADOS EN VÍA PÚBLICA	PZA	0.00
MVER-DSV-150-08	SONDEO DE POZO DE VISITA EXISTENTE, PARA DESAZOLVE Y LIMPIEZA, INCLUYE: DESAZOLVE CON EQUIPO VACTOR Y LIMPIEZA DEL MISMO. INCLUYE SEÑALIZACIÓN PARA TRABAJOS REALIZADOS EN VÍA PÚBLICA	PZA	0.00
MVER-HN-RETI-TUB-8	RETIRO DE TUBERÍA DE CONCRETO DE 8" DE DIAM., REALIZADO EN HORARIO NOCTURNO, CON EQUIPO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, INCLUYE SEÑALIZACIÓN PARA TRABAJOS REALIZADOS EN VÍA PÚBLICA	M	0.00
MVER-HN-RETI-TUB-10	RETIRO DE TUBERÍA DE CONCRETO DE 10" DE DIAM., REALIZADO EN HORARIO NOCTURNO, CON EQUIPO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, INCLUYE SEÑALIZACIÓN PARA TRABAJOS REALIZADOS EN VÍA PÚBLICA	M	0.00
MVER-HN-RETI-TUB-12	RETIRO DE TUBERÍA DE CONCRETO DE 12" DE DIAM., REALIZADO EN HORARIO NOCTURNO, CON EQUIPO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, INCLUYE SEÑALIZACIÓN PARA TRABAJOS REALIZADOS EN VÍA PÚBLICA	M	0.00
MVER-HN-RETI-TUB-15	RETIRO DE TUBERÍA DE CONCRETO DE 15" DE DIAM., REALIZADO EN HORARIO NOCTURNO, CON EQUIPO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, INCLUYE SEÑALIZACIÓN PARA TRABAJOS REALIZADOS EN VÍA PÚBLICA	M	0.00
MVER-HN-TUB-PEAD-30	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADO DE 30" REALIZADO EN HORARIO NOCTURNO, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, PIEZAS Y CONEXIONES NECESARIAS PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN, INCLUYE SEÑALIZACIÓN PARA TRABAJOS REALIZADOS EN VÍA PÚBLICA	M	0.00
MVER-HN-TUB-S20-8	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO PARA ALCANTARILLADO DE PVC S-20 SANITARIO DE 8" (20 CM.) DE DIÁMETRO, REALIZADO EN HORARIO NOCTURNO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. INCLUYE SEÑALIZACIÓN PARA TRABAJOS REALIZADOS EN VÍA PÚBLICA	M	0.00
MVER-HN-TUB-S20-10	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO PARA ALCANTARILLADO DE PVC S-20 SANITARIO DE 10" (25 CM.) DE DIÁMETRO, REALIZADO EN HORARIO NOCTURNO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. INCLUYE SEÑALIZACIÓN PARA TRABAJOS REALIZADOS EN VÍA PÚBLICA	M	0.00
	OBRAS DE DRENAJE PLUVIAL EN HORARIO NOCTURNO		
MVER-HN-TUB-S20-12	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO PARA ALCANTARILLADO DE PVC S-20 SANITARIO DE 12" (30 CM.) DE DIÁMETRO, REALIZADO EN HORARIO NOCTURNO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. INCLUYE SEÑALIZACIÓN PARA TRABAJOS REALIZADOS EN VÍA PÚBLICA	M	0.00
MVER-HN-TUB-PEAD-12	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADO DE 12" REALIZADO EN HORARIO NOCTURNO,	M	0.00

CONTRATO 2022

FISMA

2



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VERACRUZ  
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

CONTRATO No. MVER-2022-RM-0133

OBRA O SERVICIO No. 2022301930133

ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS



	INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, PIEZAS Y CONEXIONES NECESARIAS PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. INCLUYE SEÑALIZACIÓN PARA TRABAJOS REALIZADOS EN VÍA PÚBLICA		
MVER-HN-TUB-PEAD-15	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADO DE 15" REALIZADO EN HORARIO NOCTURNO, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, PIEZAS Y CONEXIONES NECESARIAS PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO.	M	0.00
MVER-HN-TUB-PEAD-18	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADO DE 18" REALIZADO EN HORARIO NOCTURNO, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, PIEZAS Y CONEXIONES NECESARIAS PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. INCLUYE SEÑALIZACIÓN PARA TRABAJOS REALIZADOS EN VÍA PÚBLICA	M	0.00
MVER-HN-BOMACH-001	BOMBEO DE ACHIQUE CON BOMBA DE 100 MM (4"), REALIZADO EN HORARIO NOCTURNO. INCLUYE: MANO DE OBRA Y EQUIPO. INCLUYE SEÑALIZACIÓN PARA TRABAJOS REALIZADOS EN VÍA PÚBLICA	HRS	0.00
	PAVIMENTOS		
MVER-PAV-MR-002	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO MR 42 KG/CM2 EDAD A 3 DÍAS REV. 10 +/- 2 CMS TMA 3/4" ELABORADO CON CEMENTO CPC40RS, CON REGLA VIBRATORIA, ESPESOR 1500 CMS. SEGÚN PROYECTO SOBRE BASE HIDRÁULICA, ACABADO RASTRILLADO, INCLUYE: CIMBRA METÁLICA, RAYADO DEL CONCRETO CON PEINE METÁLICO, ACABADO CON SELLADOR MARCA SIKA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. INCLUYE SEÑALIZACIÓN PARA TRABAJOS REALIZADOS EN VÍA PÚBLICA	M2	355.85
MVER-PAV-ASF-001	CARPETA ASFÁLTICA CON MEZCLA EN CALIENTE CONSTRUÍDO CON MATERIAL PÉTRICO DE BANCO, INCLUYE ACARREOS DE PRÉSTAMO DE BANCO DE ACUERDO A LA NORMA N-CTR-CAR-1-01-013/00. CARPETA ASFÁLTICA COMPACTADA AL 95 %, PUOT, CON ASFALTO EKBE SUPERPAVE PG 64-22 Y AGREGADO PÉTRICO DE 3/4" A FINOS, INCLUYE: HUMECTACIÓN DE SUPERFICIE PARA EVITAR POLVO Y COMPACTACIÓN AL 95% DE LA PRUEBA VRS., INCLUYE ACARREO DE MEZCLA ASFÁLTICA DE PLANTA DE ASFALTO AL CENTRO DE GRAVEDAD DE LA OBRA. INCLUYE SEÑALIZACIÓN PARA TRABAJOS REALIZADOS EN VÍA PÚBLICA	M3	15.94
MVER-CHO-F250	CONCRETO F'C=250 KG/CM2 PARA ESTRUCTURAS DE CONCRETO HECHO EN OBRA TURNO DIURNO INCLUYE SEÑALIZACIÓN PARA TRABAJOS REALIZADOS EN VÍA PÚBLICA	M3	0.00
MVER-DEM-008	DEMOLICIÓN A MANO DE PISO O BANQUETA DE CONCRETO SIMPLE DE 8 A 10 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: APILE DEL MATERIAL. INCLUYE SEÑALIZACIÓN PARA TRABAJOS REALIZADOS EN VÍA PÚBLICA	M2	0.00
MBR-GBCC-006A	BANQUETA DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=150 KG/CM2. AGREGADO MÁXIMO DE 3/4", DE 10 CM. DE ESPESOR, ACABADO ESCOBILLADO, INCLUYE: CEMENTO, VOLTEADOR, CIMBRA EN FRONTERAS, DESCIMBRADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. INCLUYE SEÑALIZACIÓN PARA TRABAJOS REALIZADOS EN VÍA PÚBLICA	M2	0.00
MBR-GBCC-006B	ELABORACIÓN DE GUARNICIÓN TRAPEZOIDAL DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=150 KG/CM2., DE 15 X 20 X 40 CM. DE SECCIÓN, INCLUYE:	M	0.00

AGOSTO 2022

FISMA








H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VERACRUZ  
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

CONTRATO No. MVER-2022-RM-0133

OBRA O SERVICIO No. 2022301930133

ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS



	CIMBRA METÁLICA, DESCIMBRADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. INCLUYE SEÑALIZACIÓN PARA TRABAJOS REALIZADOS EN VÍA PÚBLICA		
EXT-HUND-016	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA SEGÚN NORMA, TRÁFICO PESADO EN GUARNICIONES CON UN DESARROLLO DE 30 CM., INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. INCLUYE SEÑALIZACIÓN PARA TRABAJOS REALIZADOS EN VÍA PÚBLICA	M	0.00
	PAVIMENTOS EN HORARIO NOCTURNO		
MVER-HN-PAV-ASF-001	CARPETA ASFÁLTICA CON MEZCLA EN CALIENTE CONSTRUIDO CON MATERIAL PÉTRICO DE BANCO, REALIZADO EN HORARIO NOCTURNO, INCLUYE ACARREOS DE PRÉSTAMO DE BANCO DE ACUERDO A LA NORMA N-CTR-CAR-1-01-013/00. CARPETA ASFÁLTICA COMPACTADA AL 95 %, PUOT, CON ASFALTO EKBE SUPERPAVE PG 64-22 Y AGREGADO PÉTRICO DE 3/4" A FINOS, INCLUYE: HUMECTACIÓN DE SUPERFICIE PARA EVITAR POLVO Y COMPACTACIÓN AL 95% DE LA PRUEBA VRS., INCLUYE ACARREO DE MEZCLA ASFÁLTICA DE PLANTA DE ASFALTO AL CENTRO DE GRAVEDAD DE LA OBRA. INCLUYE SEÑALIZACIÓN PARA TRABAJOS REALIZADOS EN VÍA PÚBLICA	M3	0.00
	PAVIMENTOS EN HORARIO NOCTURNO		
MVER-HN-PAV-MR-020	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO MR 42 KG/CM2 EDAD A 3 DÍAS REV. 10 +/- 2 CMS TMA 3/4" ELABORADO CON CEMENTO CPC40RS, CON REGLA VIBRATORIA, ESPESOR 20.00 CMS SEGÚN PROYECTO SOBRE BASE HIDRÁULICA, ACABADO RASTRILLADO, REALIZADO EN HORARIO NOCTURNO, INCLUYE: CIMBRA METÁLICA, RAYADO DEL CONCRETO CON PEINE METÁLICO, ACABADO CON SELLADOR MARCA SIKA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. INCLUYE SEÑALIZACIÓN PARA TRABAJOS REALIZADOS EN VÍA PÚBLICA	M2	0.00
MBR-HN-GBCC-006B	ELABORACIÓN DE GUARNICIÓN TRAPEZOIDAL DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=150 KG/CM2., DE 15 X 20 X 40 CM. DE SECCIÓN, REALIZADO EN HORARIO NOCTURNO, INCLUYE: CIMBRA METÁLICA, DESCIMBRADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. INCLUYE SEÑALIZACIÓN PARA TRABAJOS REALIZADOS EN VÍA PÚBLICA	M	0.00
MBR-GBCC-006B-1	ELABORACIÓN DE GUARNICIÓN TRAPEZOIDAL DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=150 KG/CM2., DE 15 X 30 X 60 CM. DE SECCIÓN, INCLUYE: CIMBRA METÁLICA, DESCIMBRADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. INCLUYE SEÑALIZACIÓN PARA TRABAJOS REALIZADOS EN VÍA PÚBLICA	M	0.00
	LIMPIEZA		
MVER-LIMF-001	LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA, RETIRO DE ESCOMBRO PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN Y EXCAVACIÓN, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. INCLUYE SEÑALIZACIÓN PARA TRABAJOS REALIZADOS EN VÍA PÚBLICA	M2	418.83

ENERO 2022






H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VERACRUZ  
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

CONTRATO No. MVER-2022-RM-0133

OBRA O SERVICIO No. 2022301930133

ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS



**CUARTO. RELACIÓN DE ESTIMACIONES O GASTOS APROBADOS**

Las partes están de acuerdo que, a la fecha de recepción de los trabajos, las estimaciones y gastos aprobados del contrato mencionado en el punto PRIMERO fracción I de la presente acta, se realizaron con base en las cantidades siguientes:

CONCEPTO	TOTAL C / IVA
ANTICIPO	\$ 300,000.00
ESTIMACIÓN 1	\$ 120,000.00
ESTIMACIÓN 2	\$ 766,650.00
ESTIMACIÓN 3 A	\$ 572.53
ESTIMACIÓN 3 FINIQUITO	\$ 127,523.62

**Estimaciones pendientes de autorización:**

No hay estimaciones pendientes de autorización

**QUINTO. DOCUMENTACIÓN SOPORTE**

"EL CONTRATISTA" manifiesta que entregó en tiempo y forma, a la residencia o supervisión, la documentación derivada de la realización de los trabajos, misma que a partir de este momento queda bajo resguardo de "EL H. AYUNTAMIENTO" y se anexa al expediente técnico unitario.

**OTORGADO 2022**

**SEXTO. FIANZA**

"EL CONTRATISTA", exhibirá, previo a la firma del finiquito, la garantía por defectos y vicios ocultos prevista en el artículo 68 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz, misma que estará vigente por un periodo de 24 meses a partir de la fecha de firma de este documento.

**SÉPTIMO. FINIQUITO QUE EXTINGUE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES**

Para dar por terminados, totalmente los derechos y obligaciones asumidas por las partes derivados del contrato mencionado en el punto primero, será otorgado el finiquito dentro de los 10 (Diez) días naturales siguientes a la fecha de elaboración de la presente acta.

Quedan de acuerdo las partes que el FINIQUITO se celebre en punto de las 15:00 horas del día 29 DE DICIEMBRE DE 2022, en el domicilio de la Subdirección de Obras Públicas.

**FISM**

*[Firma]*




H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VERACRUZ  
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO



CONTRATO No. MVER-2022-RM-0133

OBRA O SERVICIO No. 2022301930133


ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS



No habiendo otro asunto que tratar y enteradas las partes del contenido y alcance legal de la presente acta, se cierra a las 12:30 horas del día de su apertura, suscribiéndola los comparecientes en 5 (cinco) tantos, para los efectos legales a que haya lugar.

<p><u>POR "EL H. AYUNTAMIENTO"</u></p>  <p>ING. HECTOR SALAZAR Y HERNÁNDEZ COORDINADOR DE SUPERVISIÓN</p>	<p><u>POR "EL H. AYUNTAMIENTO"</u></p>  <p>ARQ. PAOLA NAJERA BAEZ SUPERVISOR</p>
--	---

OPERADO 2022

<p><u>POR "EL CONTRATISTA"</u></p>  <p>REPRESENTANTE LEGAL COPOC, S.A. DE C.V.</p>
---

FISMA

