



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VERACRUZ
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 CIERRE DE EJERCICIO 2022

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 183 VERACRUZ
 Fuente de Financiamiento: CONZA
 Presupuesto Autorizado: 112,866.00

Programa		Subprograma		Avances Físico-Financieros		Estructura Financiera (Inversión Aprobada)								Estructura Financiera (Inversión Devengada)						Estructura Financiera (Inversión Pagada)						Estructura Financiera (Saldo)						Metas			Observaciones															
No. Obra	Tipo	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	%	Físico		Financiero		Situación de la Obra	Modalidad de Ejecución	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficia-rios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficia-rios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficia-rios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas		Alcanzadas														
						Inicio	Término	Inicio	Término																												Inicio	Término	Inicio	Término	Inicio	Término	Inicio	Término	Inicio	Término	Inicio	Término	Inicio	Término
01	SE	REHABILITACION DE LAS LUMINARIAS DEL BALLASTE DE SANTIGRO, CENTRO HISTORICO, VERACRUZ, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE	30193000	VERACRUZ	100.00	19/11/2022	03/12/2022	100.00	23/12/2022	23/12/2022	TERMINADA	CONTRATO	\$112,866.00	\$112,866.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$112,866.00	\$112,866.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	1,000.00	5.00	5.00	
TOTAL DE INVERSIÓN DEL FINANCIAMIENTO DEL MUNICIPIO:													\$112,866.00	\$112,866.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$112,866.00	\$112,866.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00				

Patricia Lobeira Rodríguez
 PRESIDENTE(A) MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

Rosario Ruiz Lagunes
 TESORERO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

Taurino Caamaño Quitano
 CONTRALOR MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

CIE/2022/VERACRUZ/17656



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VERACRUZ
INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
CIERRE DE EJERCICIO 2022

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
Clave y Nombre del Municipio: 183 VERACRUZ
Fuente de Financiamiento: FISMOF
Presupuesto Autorizado: 188,081,374.00

Table with columns: Programa, Subprograma, Tipo, No. Obra, Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra, Clave de Localidad, Localidad, Avances Físico-Financieros (Físico, Financiero), Estructura Financiera (Inversión Aprobada), Estructura Financiera (Inversión Devengada), Estructura Financiera (Inversión Pagada), Estructura Financiera (Saldo), Metas (Unidad de Medida, Aprobadas, Alcanzadas), Observaciones.

Patricia Ichebra Rodríguez
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

Arturo Nolasco Domínguez
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
Nombre y firma

Rosario Ruli Lagunes
TESORERO MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

Taurine Casañero Quintana
CONTRALOR MUNICIPAL
Nombre, firma y sello



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VERACRUZ
INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
CIERRE DE EJERCICIO 2022

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
Clave y Nombre del Municipio: 193 VERACRUZ
Fuente de Financiamiento: FEFMPHM 2021
Presupuesto Autorizado: 3,193,186.01

Programa		Subprograma		Avances Físico-Financieros				Estructura Financiera (Inversión Aprobada)								Estructura Financiera (Inversión Devengada)								Estructura Financiera (Inversión Pagada)								Estructura Financiera (Saldo)						Metas			Observaciones																
Tipo				Físico		Financiero																																																			
No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra		Clave de Localidad	Localidad	%	Fechas reales		%	Fechas reales		Situación de la Obra	Modalidad de Ejecución	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficencias	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficencias	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficencias	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficencias	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros		Unidad de Medida	Aprobadas	A alcanzadas													
SE	04	MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO DEL DISTRIBUIDOR VIAL AEROPUERTO, UBICADO EN LA CARRETERA FEDERAL VERACRUZ-XALAPA, VERACRUZ, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.		30193000	1	VERACRUZ	100.00	17/09/2022	15/12/2022	100.00	27/12/2022	27/12/2022	TERMINADA	CONTRATO	3,000,000.00	2,901,186.00	0.00	0.00	98,814.00	0.00	0.00	3,000,000.00	2,901,186.00	0.00	0.00	98,814.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	2,901,186.00	0.00	0.00	98,814.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	1,000.00	51.00											
2022	30	193	0401																																																						
UM	02	CONSTRUCCION DE REDUCTORES DE VELOCIDAD EN ARTERIAS URBANAS (BOYAS) 1. VERACRUZ, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.		30193000	1	VERACRUZ	100.00	01/06/2022	30/06/2022	100.00	27/12/2022	27/12/2022	TERMINADA	CONTRATO	292,000.01	292,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292,000.01	292,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	500.00	1.00	1.00								
2022	30	193	0403																																																						
TOTAL DE INVERSIÓN DEL FINANCIAMIENTO DEL MUNICIPIO:														\$3,292,000.00	\$3,193,186.00	0.00	0.00	\$98,814.00	0.00	0.00	\$3,292,000.00	\$3,193,186.00	0.00	0.00	\$98,814.00	0.00	0.00	\$3,292,000.00	\$3,193,186.00	0.00	0.00	\$98,814.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Patricia Lobeira Rodríguez
PRESIDENTE(A) MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

Rosario Ruíz Lagunes
TESORERO MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

Taurino Caamaño Quitano
CONTRALOR MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

CIE/2022/VERACRUZ/7652




H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VERACRUZ
INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
CIERRE DE EJERCICIO 2022

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
Clave y Nombre del Municipio: 193 VERACRUZ
Fuente de Financiamiento: FEFPMH
Presupuesto Autorizado: 32,050,000.00

Hoja: # de #
Fecha de Aprobación:

Table with columns: Programa, Subprograma, Tipo, No. Obra, Nombre del Proyecto, Clave de Localidad, Localidad, Fechas reales, Estructura Financiera (Inversión Aprobada), Estructura Financiera (Inversión Devengada), Estructura Financiera (Inversión Pagada), Estructura Financiera (Saldo), Metas, Observaciones.

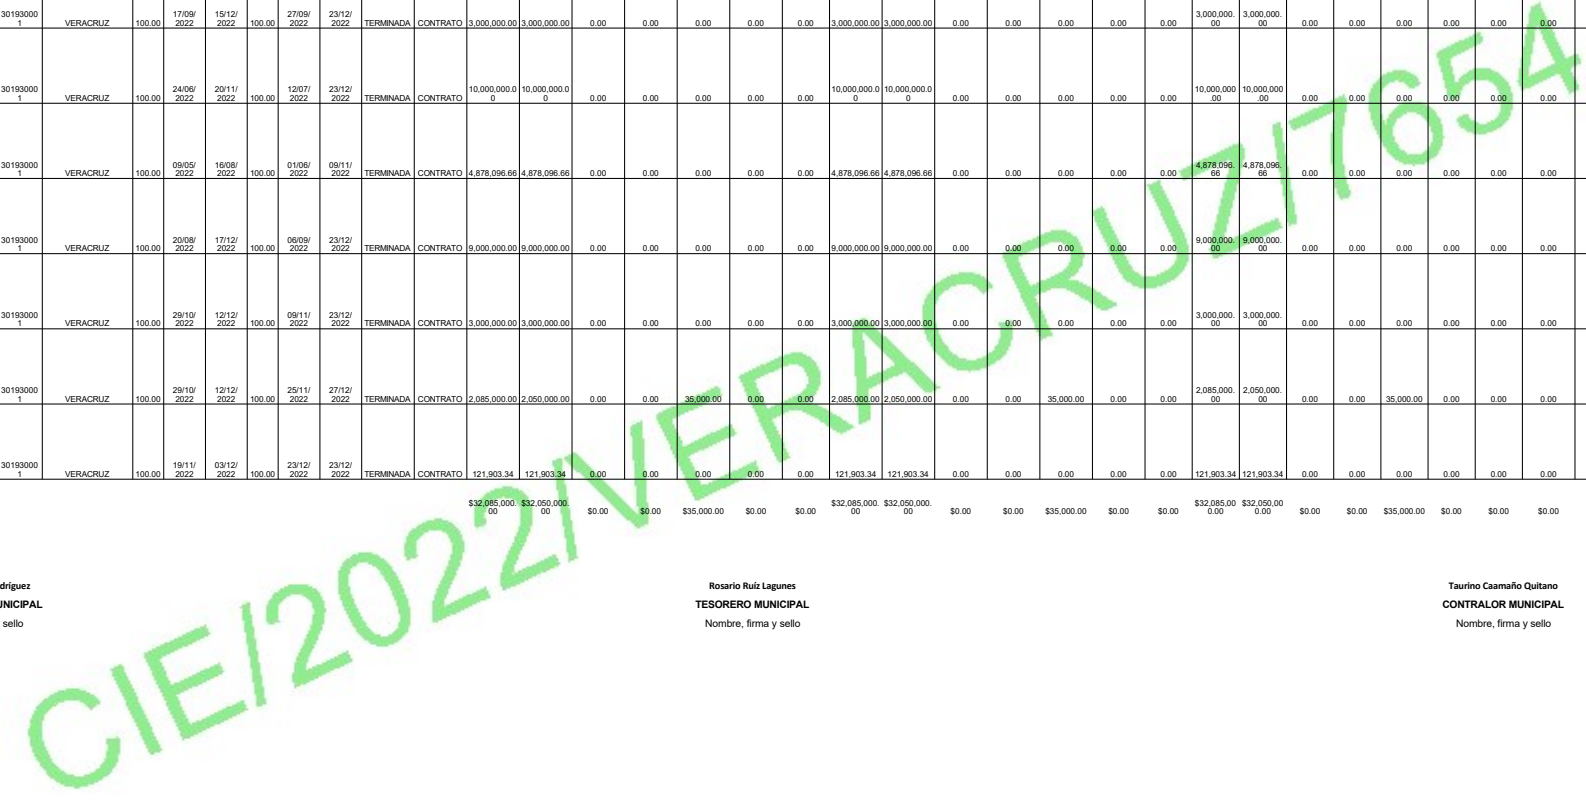

Patricia Lobeira Rodríguez
PRESIDENTE(A) MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

Rosario Ruiz Lagunes
TESORERO MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

Taurino Caamaño Quitano
CONTRALOR MUNICIPAL
Nombre, firma y sello



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VERACRUZ
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 CIERRE DE EJERCICIO 2022

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 193 VERACRUZ
 Fuente de Financiamiento: RECFSICALES
 Presupuesto Autorizado: 9,251,347.64

Hoja: # de # 1 de 1
 Fecha de Aprobación:

Programa				Avances Físico-Financieros						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)						Estructura Financiera (Inversión Devengada)						Estructura Financiera (Inversión Pagada)						Estructura Financiera (Saldo)						Metas			Observaciones																											
Subprograma				Físico		Financiero				Situación de la Obra						Costo Total						Fuente de Financiamiento						Aportación						Costo Total						Unidad de Medida																								
No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra			Clave de Localidad	Localidad	%	Fechas reales		%	Fechas reales		Situación de la Obra	Modalidad de Ejecución	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficencias	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficencias	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficencias	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento		Aportación Municipal	Aportación Beneficencias	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficencias	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas	Ancanzadas												
UM 01 p 2022 30 193 0204	REHABILITACIÓN ALBERGUE NOCTURNO, CENTRO HISTORICO, VERACRUZ, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE			301930001	VERACRUZ	100.00	13/05/2022	09/09/2022	100.00	26/05/2022	23/12/2022	TERMINADA	CONTRATO	2,168,551.13	2,168,551.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,168,551.13	2,168,551.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,168,551.13	2,168,551.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1.00	1.00										
SD 01 b 2022 30 193 0213	REHABILITACIÓN DE HUNDIMIENTOS, CENTRO HISTORICO, VERACRUZ, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE			301930001	VERACRUZ	100.00	10/06/2022	07/10/2022	100.00	29/08/2022	30/12/2022	TERMINADA	CONTRATO	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	200.00	200.00									
SE 04 f 2022 30 193 0215	MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA AV. SALVADOR DIAZ MIRON DEL PARQUE ZAMORA A SIMON BOLIVAR, VERACRUZ, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE			301930001	VERACRUZ	100.00	25/10/2022	08/12/2022	100.00	25/11/2022	27/12/2022	TERMINADA	CONTRATO	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	POSTE	50.00	50.00			
SD 01 c 2022 30 193 0216	REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLA PLUVIAL, EN EL ACCESO A MATACOCULTE, MATACOCULTE, VERACRUZ, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE			301930007	MATA COCLUTE	100.00	22/12/2022	30/12/2022	100.00	27/12/2022	27/12/2022	TERMINADA	CONTRATO	2,082,796.51	2,082,796.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,082,796.51	2,082,796.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,082,796.51	2,082,796.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	307.88	316.00
TOTAL DE INVERSIÓN DEL FINANCIAMIENTO DEL MUNICIPIO:															9,251,347.64	9,251,347.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,251,347.64	9,251,347.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,251,347.64	9,251,347.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Patricia Lobeira Rodríguez
 PRESIDENTE(A) MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

Rosario Ruíz Lagunes
 TESORERO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

Taurino Caamaño Quitano
 CONTRALOR MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

CIE/2022/VERACRUZ/217655
